

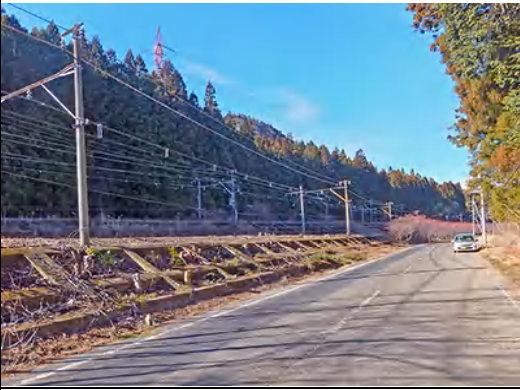
碓氷峠鉄道再生研究会 作業報告

2024年 1月 作業報告

作成日 ;R06.01.31

- ・1月は、景観復旧作業の一環としてコンクリート格子内の灌木や枯れ草の処理を行いました。
主に県道側のコンクリート格子部分の枯れ草を刈り取り景観を整備しました。
- ・作業時の移動用や資材運搬用の目的で軌道自転車を開発してます。
試作2号機の課題抽出と対策後の走行実験を行いました。多段変速機付きなので66.7パーミルも上れます。
軌道自転車を使用すれば、上り線1号トンネル出口から峠の湯付近まで約9分で移動可能になります。

作業日 ;12日、18日、29日 延べ人数8人 作業時間 ;9:00～12:00

	県道脇の上り線の法面の枯れ草刈りを実施	1月18日	草刈り作業後の景観
作業前（作業中）		作業後	
2	県道脇の上り線の法面の枯れ草刈りを実施	1月18日	草刈り作業後の景観
作業前（作業中）		作業後	
3	軌道自転車の走行実験（課題抽出）	1月12日	課題抽出を行い問題点を洗い出しました。
作業前（作業中）		作業後	
4	問題対策後の走行実験 補強材を追加して対策	1月29日	1号トンネル出口から峠の湯付近まで走行実験実施
作業前（作業中）		作業後	
